

喀什市浩罕乡 2025 年拱棚建设项目设计答疑

1. 预埋钢管 $\Phi 38*2$ 无法与大棚拱杆连接

回复：预埋钢管 $\Phi 30*60*2$ 镀锌椭圆管用缩头链接，镀锌椭圆管两端头根据螺栓连接尺寸钻 $\varnothing 8$ 圆孔

2. 压膜绳采用绞制涤纶线压膜绳

回复：间距按 1.8m 计算

3. 基础混凝土等级

回复:C25

4. 节点钢板厚度

回复：按 6mm 计入

5. 紧绳器按几个计入

回复：每个棚按 2 个计入

6. 管道沟槽开挖回填大样中主回填区为符合要求的原土或中、粗砂、碎石屑、最大粒径 $<40\text{mm}$ 的砂砾回填，选取哪一类？

回复：主回填区及次回填区的都为中粗砂。

7. 暖棚入口闸阀井是否需要每个棚都布置，建议核实？

回复：取消每个棚门口处阀门井，在主管拐至每组大棚处集中放置一个阀门井。

8. 每座棚是否需设置出地桩，出地高度为多少 cm，建议核实？

回复：需设置，出地距离为 30cm。


9. 图中 8 村、15 村给水管材质为 PPR 管与其余村不一致，建议核实：

回复：材质与其余村一致，都为 PE 钢丝钢丝骨架管

10.预算及图纸中未明确棚膜材质，10 丝/12 丝棚膜材质

回复：聚烯烃（PO）棚膜

11.拱架在图纸中存在问题

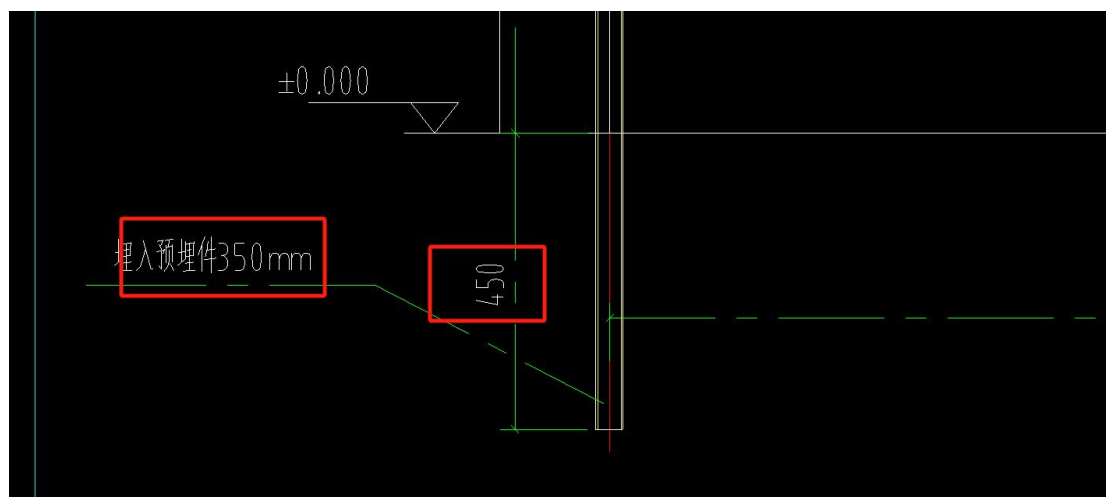

回复：按预埋 450mm

12. 基础防腐做法

回复：一道冷底子油两道热沥青

13. 门框柱和梁的做法统一

回复：门框梁镀锌方钢 30*2，门框柱镀锌方钢 60*2

